经营复盘 / 2026 Q3

从比选走向交付

冷却系统更新已完成供应商比选。后续采购以委员会批准为前提。

资金变化 · 元

项目	原预算	调整后	差额
冷却模组	216,000	270,000	54,000
接入工程	42,000	42,000	—
交付检验	16,000	16,000	—
合计	**274,000**	**328,000**	**54,000**

预算增幅	**19.7%**

变动来源


新增预算全部来自冷却模组。

单价不变，数量由 12 套调整为 15 套。

审批后：工程组实施，运营组验收。

执行台账

事项	负责人	状态	下一步
冷却系统	工程组	**待批准**	获批后采购
并网资料	能源组	进行中	继续准备
施工窗口	运营组	已确认	维持计划

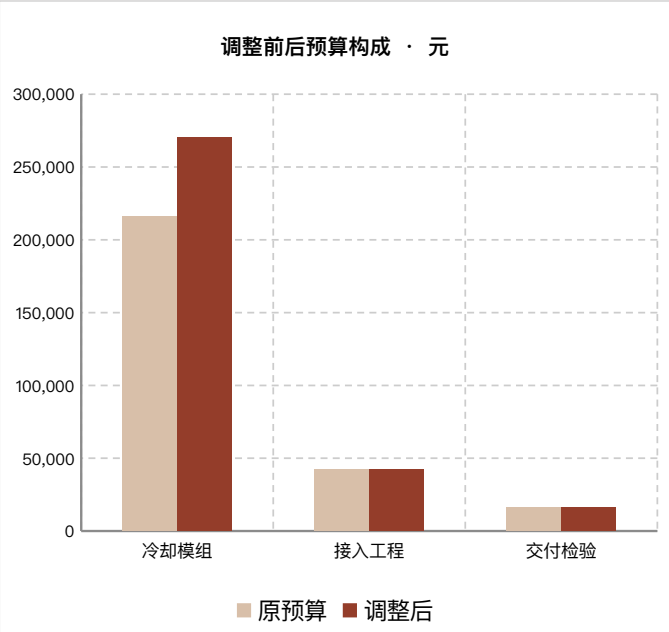

来源：同一经营样稿与预算底表。金额、增幅和图表引用「输入」工作表。

预算底表 / 输入

北港园区预算输入

金额单位：人民币元。浅黄色为可编辑输入，预算金额由公式计算。

科目	单位	原数量	调整数量	含税单价	原预算	调整预算
冷却模组	套	12	15	18,000	216,000	270,000
接入工程	项	1	1	42,000	42,000	42,000
交付检验	批	2	2	8,000	16,000	16,000
合计					**274,000**	**328,000**

输入口径：工程数量 × 含税单价；本次只调整冷却模组数量。
