北港园区


从比选走向交付

冷却系统更新已有比选结果，采购仍待预算批准。

调整后预算	采购数量	供应商比选
32.8 万元	15 套	已完成

新增投入集中在冷却模组

金额单位：万元。浅色条为原预算，砖红色条为调整后预算。

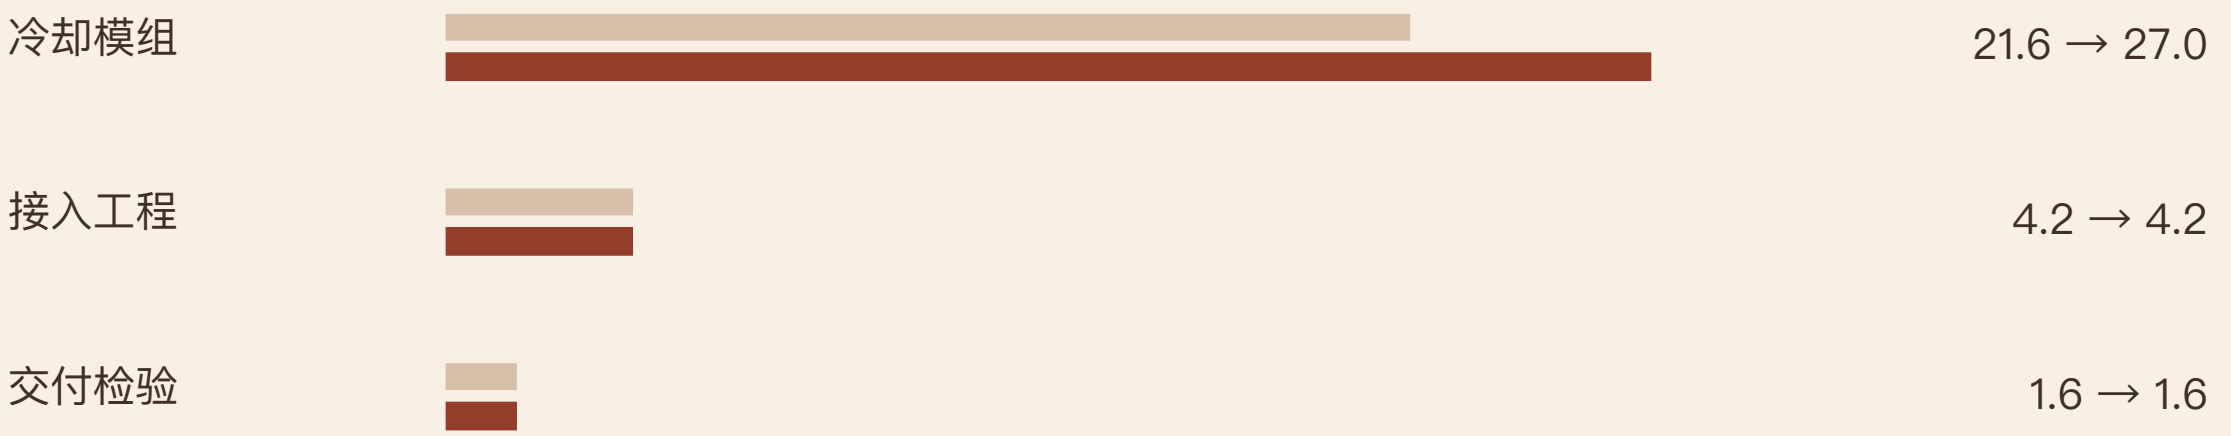

总预算　27.4 → 32.8 万元

+5.4 万元 / +19.7%

事项推进到哪一步

三项工作分别由工程组、能源组、运营组跟进。

01	冷却系统更新	工程组	待批准
02	并网资料准备	能源组	进行中
03	施工窗口确认	运营组	已确认

从预算决议到验收

审批、实施和验收各有清楚的责任交接。

当前需要的决定

批准 32.8 万元

采购数量： 15 套

执行采购与实施	工程组
完成交付验收	运营组
登记付款进度	采购组
